

- 앞산 관광 명소화 사업 콘텐츠 제작·설치 -
과 업 이 행 요 청 서



1. 사업명 : 앞산 관광 명소화 사업 콘텐츠 제작·설치

2. 추진배경

- 가. 앞산 관광 명소화 사업은 전국의 아름다운 도시야경 Best 8 중 하나인 앞산의 노후 인프라 시설을 정비하여 앞산 정상의 뛰어난 조망권과 자연경관을 이용한 “**新여가·문화공간**” 조성을 이루고자 사업을 추진중에 있음
- 나. 대덕산성 문화재보호구역 내 사업으로 찾아오는 관광객의 수요가 큰 폭으로 증가하여 기존 전망대에서는 관광객 수용하기에 한계가 있고, 안전상 문제가 야기될 수 있어 기존 전망대를 개체하고 “**달 토끼가 안내하는 소원길**”을 주제로 노후 시설인 팔각정과 능운정을 리모델링 하여 접근성을 높이고 산정 휴게소(케이블카)주변 등에 쉼터를 조성 야간관광의 즐거움을 제공하여 관광객을 수용코자 인프라시설 사업을 추진중에 있음
- 다. 앞산 관광 명소화 사업 인프라 시설물 설치와 아울러 앞산을 이용하는 시민들에게 앞산에 관련된 역사를 이해하고 흥미를 가질 수 있는 맞춤형 콘텐츠를 개발하여 ‘**대구 앞산**’을 **관광명소로 브랜드화**하여 지역 경제 발전에 기여코자 함

3. 사업목적

앞산 정상의 뛰어난 조망권과 자연경관을 가진 도시관광 및 역사와 문화를 주제로 다양한 콘텐츠를 구성하여 앞산을 이용하는 방문객에게 흥미를 유발할 수 있는 차별화된 콘텐츠 공간을 조성하고자 함

4. 과업개요

- 가. 사 업 명 : 앞산 관광 명소화사업 콘텐츠 제작·설치
- 나. 위 치 : 남구 앞산공원 일원(전망대 ~ 능운정 구간)
- 다. 사업기간 : 착수일로부터 150일(설계, 제작·설치 병행추진)
※ 총 사업기간은 발주기관의 사정 및 공정 등에 따라 변경될 수 있음
- 라. 사 업 비 : 금1,000,000,000원
※ 기획·디자인, 설계, 제작·설치, 자문, 제세공과금, 인·허가, 부가가치세 등 본 사업에 소요되는 모든 일체 비용 포함

마. 사업범위 : 전망대, 능운정, 팔각정, 쉼터, 등산로 구간

바. 사업내용

- 1) 기획·디자인, 기본 및 실시설계
- 2) 대구 주요 문화재 및 주요 경관·관광지 포인트 소개 안내판, 포토존 등 설치
- 3) 대덕산성 문화재 관련 전시모형, 역사콘텐츠 영상물 설치 등
- 4) 역사적 공간, 역사길 스토리텔링을 통한 콘텐츠 발굴 및 개발
- 5) 앞산의 역사문화 사계 등 앞산의 가치를 살릴 수 있는 콘텐츠 공간구성
- 6) 인근 안지랑 곱창골목, 카페골목, 근대골목, 서문시장, 수성못 등 대구 대표 관광지와 연계하는 역할을 할 수 있는 공간구성
- 7) 기타 발주처에서 필요하다고 요구하는 사항

5. 계약방법

가. 입찰방식 : 제한경쟁입찰

나. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

- 1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조
- 2) 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준[행정안전부 예규]

Ⅱ 과업수행 세부내용

1. 과업범위

가. 공간적 범위

1) 위치 : 대구광역시 남구 앞산공원 일원(전망대 ~ 능운정)



→ 현재 위치사진




나. 내용적 범위

1) 테마 도출(안)


- 도심형 근린공원인 야간관광명소화를 목표로
- 달과 토끼의 스토리를 부여하고 위로와 약속의 의미를 품은 관광명소로 탈바꿈하고자 함




2) 개념도(안)

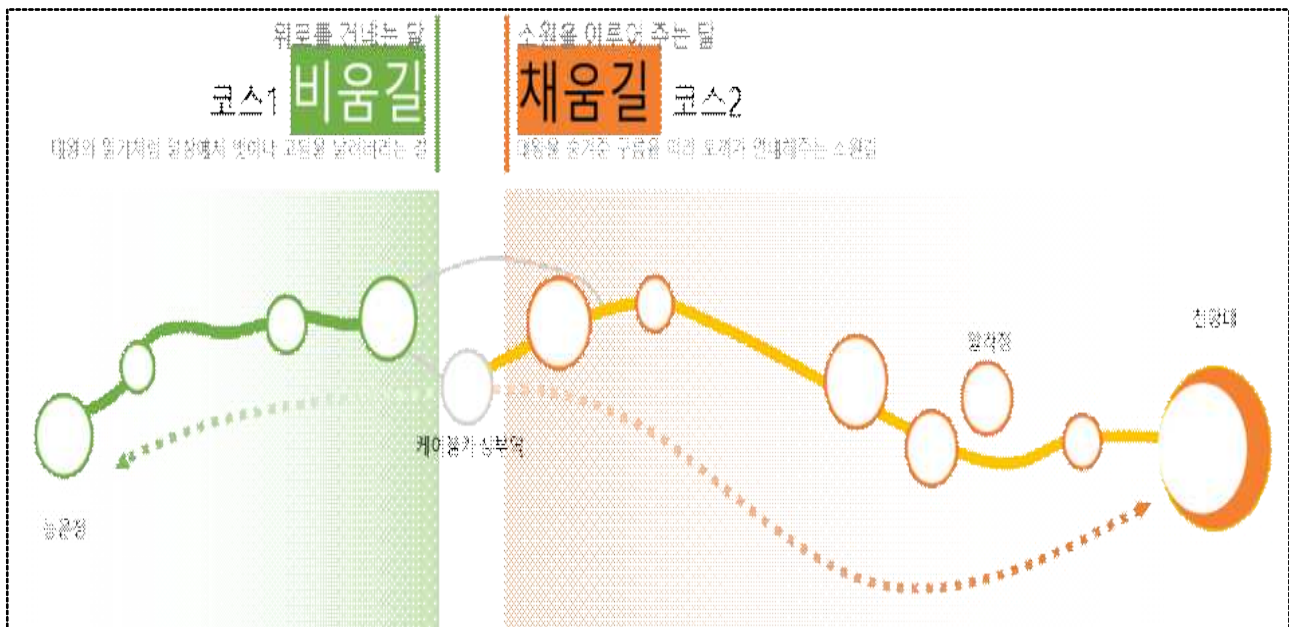


3) 인프라시설 계획도(사업 추진중)

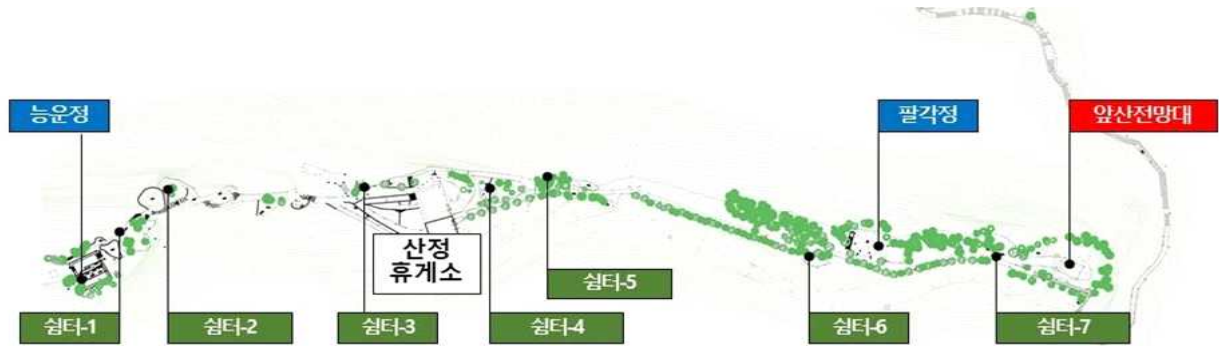

4) 쉼터 예시도(사업 추진중)

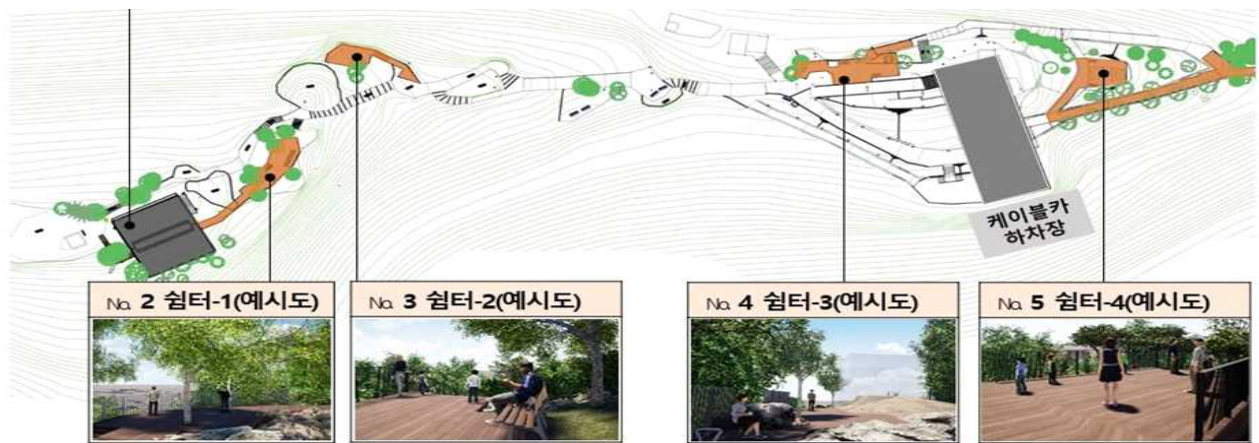

5) 전망대 개체(안)(사업 추진중)

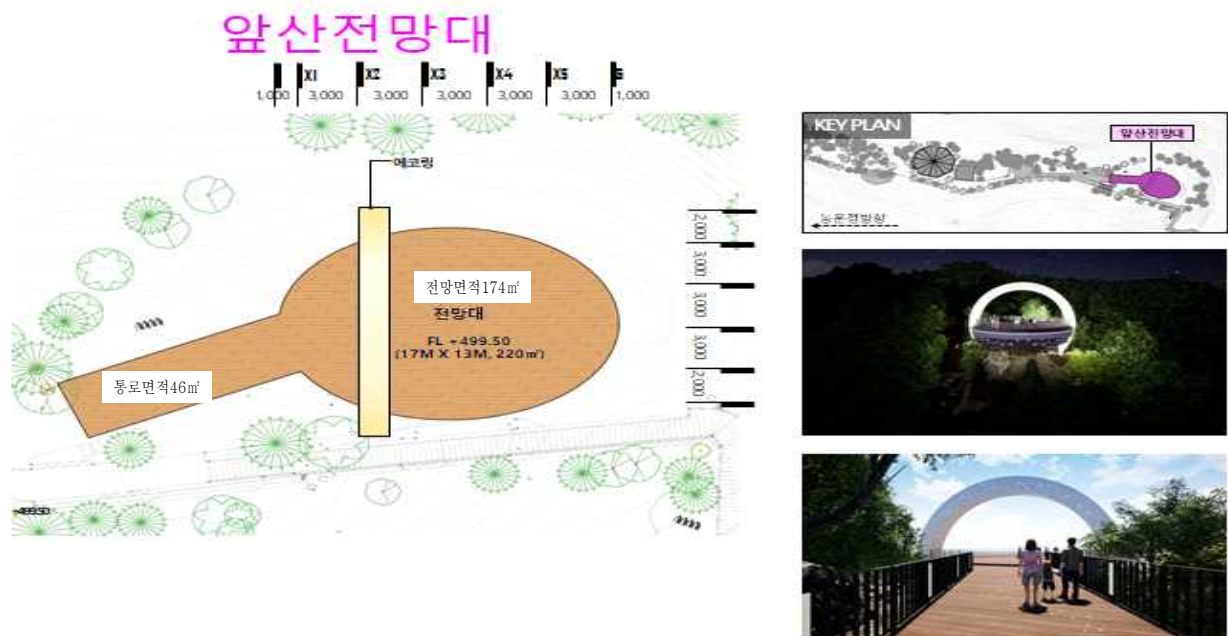


6) 능운정 리모델링(안)(사업 추진중)

변경 전



변경 후

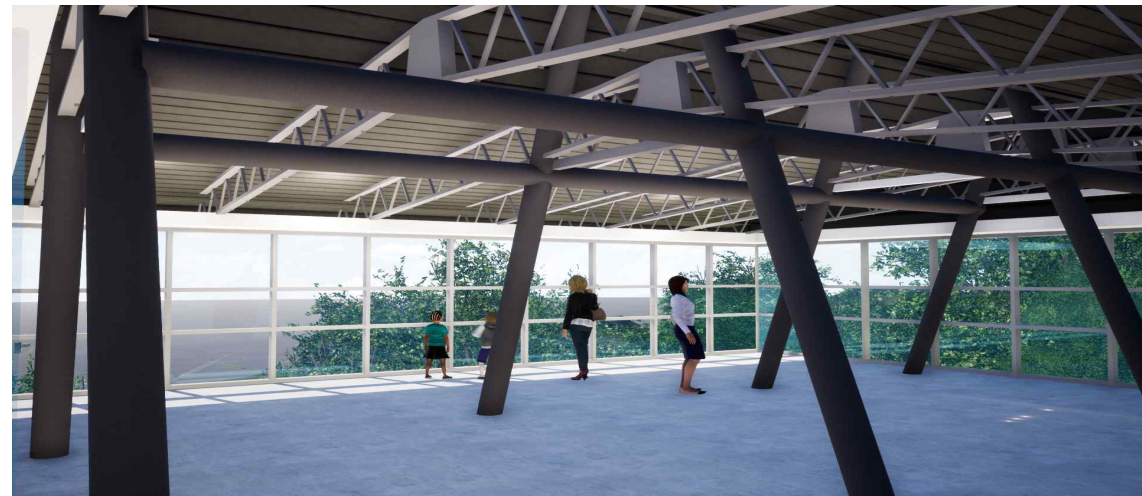

내
부



전
경

7) 팔각정 리모델링(안)(사업 추진중)



다. 사업의 세부내용

1) 전망대 구간(면적 약 220㎡ 정도)

- 설명패널 설치
 - 대구 주요 문화재 및 주요 경관 · 관광지 포인트 소개, 안내판 설치 등
 - 과거 · 현재를 비교하는 대구시의 발전상 등
- 키오스크 설치
 - 앞산의 역사, 문화, 자연경관 등 다양한 주제의 정보 제공 및 대구시와 앞산의 이야기, 역사적 사건 소개, 인근 맛집 등 소개
- 도심형 근린공원인 앞산의 야간관광명소화를 목표로 ‘달토끼가 안내하는 소원길’이라는 테마에 맞추어 전망대에서 도심을 내려다보며 소원을 이루어 주는 **달과 토끼 조형물 및 포토존 등 설치**
- 전망대에서 도심을 멀리 조망할 수 있는 최신식 망원경 설치
- 친환경 소재와 안전성을 우선으로 한 자재 선택 및 유지관리가 쉬운 디자인 및 재질 검토 반영
- 시민들에게 친근한 색채와 활동성을 고려한 공간 디자인 제공
- 기타 발주처에서 요구하는 사항 등

2) 능운정 구간(면적 약 195㎡ 정도)

- 문화재 전시공간 구성(대덕산성 문화재 전시모형, 역사콘텐츠 영상물 등)
- 앞산의 역사문화, 자연경관, 문화관광자원을 연계한 스토리텔링을 구성·발굴하여 디지털갤러리, 애니메이션, 그래픽 등 미디어 콘텐츠 공간구성

- 키오스크 설치

- 앞산의 역사, 문화, 자연경관 등 다양한 주제의 정보 제공 및 대구시와 앞산의 이야기, 역사적 사건 소개 등

- 기타 발주처에서 요구하는 사항 등

3) 팔각정 2층 중 1층(면적 약 87㎡ 정도)

- 앞산의 야생화, 음지식물 등 전시공간 마련
- 휴게공간 조성(단체 벤치의자 설치) 등
- 기타 발주처에서 요구하는 사항 등

4) 쉼터 조성구간(7개소 면적 850㎡ 정도 : 야간경관 포함)

- 앞산의 가치 및 사계 등 앞산의 가치를 살릴 수 있는 콘텐츠 공간 구성
- 독서·사색하는 공간 마련 등
- 주간 및 야간 관광 명소로서 방문자들의 재 방문을 활성화 하고 관광객들이 머물고 볼 수 있도록 테마 도출(안)과 관련한 조형물 등 설치
(매 쉼터마다 포토존 설치 등)
- 기타 발주처에서 요구하는 사항 등

※ 과업의 규모는 발주기관의 사업계획 변경에 따라 조정할 수 있으며, 주요 과업 방향을 바탕으로 제안자가 창의적이고 자유롭게 구성 및 제안하며, 과업의 성공적인 수행을 위하여 본 구상안의 내용을 추가하거나 일부 변경하여 제시 할 수 있음

2. 과업 기본방향

- 가. 전국의 아름다운 도시야경 Best 8 중 하나인 앞산의 노후 방치된 인프라 시설을 정비하고 앞산을 이용하는 시민들에게 앞산에 관련된 역사를 이해하고 흥미를 가질 수 있는 맞춤형 콘텐츠를 개발하여 대구의 랜드마크적 도심 관광명소로 브랜드화 하여 지역 경제 발전에 기여코자 함
- 나. 경관조명과 조형물을 활용한 다채로운 구성과 연출로 야간에 앞산전망대를 방문하는 시민들과 관광객들이 흥미를 가질 수 있도록 공간계획이 이루어져야 하며, 지리적 특성을 고려하여 방문객의 안전이 최우선적으로 반영된 시설 계획이 필요함
- 다. 앞산전망대 및 인근 안지랑 곱창골목, 카페골목, 근대골목, 서문시장, 수성못 등 대구 대표 관광지들과 연계가 가능하도록 구성하고 유지관리에 용이하도록 관련 콘텐츠 기획 및 구성 필요

3. 기본지침

- 가. 본 사업의 목적과 제안요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획되어야 함
- 나. 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관련 규정 및 제반규정을 검토한 후 적법하게 제작·설치될 수 있도록 계획하여야 함
- 다. 본 과업은 현재 추진중인 「앞산 관광 명소화 사업」과 병행 추진하는 사업이므로 해당 사업과 긴밀한 협조체계를 유지하여 추진하여야 함
- 라. 설계·제작·설치·실물 구매는 필요시 관련분야 전문가, 학술단체 등의 고증과 자문을 받고, 각 단계별로 발주기관과 협의 후 시행하여야 함
- 마. 안전성에 문제가 없도록 하며, 시설물 설치 후에도 운영·유지·보수·사후관리가 용이하고 관리비용이 최소화 되도록 설계하여야 함
- 바. 시설물(조형물, 조명등)은 주변 경관을 해치지 않고, 주변 수목에 영향이 최소화 할 수 있도록 설계하여야 함
- 사. 다수의 사람들이 이용하는 장소임을 감안하여 시설물의 내구성, 구조적 안전성, 유지관리의 편리성, 보행자의 훼손예방 등이 충분히 반영될 수 있도록 검토하여야 함
- 아. 모든 자재는 소방법, 전기법 등 관련 법규 및 규정에 적합한 자재를 사용하여야 함
- 자. 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경 할 수 있으며, 이에 따른 간접비 지급은 없음
- 차. 본 과업 수행으로 인하여 생산된 모든 성과품 일체에 대한 소유권은 발주기관에게 있으며, 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달하다고 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 과업수행자는 이를 성실히 보완하여야 함
- 카. 과업이행요청서 상 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대해 발주기관과 이견이 있을 경우 상호 협의하여 결정하며, 그래도 의견이 상이할 경우 관련 법규, 규정에 따르거나 발주기관의 해석에 따라야 함

4. 세부지침

가. 일반사항

- 1) 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주기관의 승인을 득한 후 설계한다.

- 2) 제작·설치단계에서 기술발전 등으로 인해 설계 시 제시한 기준 및 사양보다 고급사양이 출시될 경우에는 납품일을 기준으로 하여 최신사양으로 대체한다.
- 3) 계약자는 계약 시설물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리해야 하며, 그 비용은 계약자가 부담하여야 한다.
- 4) 현장가설물 및 창고는 계약자 비용부담으로 설치하고, 시설물을 보관할 공간을 확보하여야 한다. 사업 일정의 변경 등으로 보관 기간이 연장으로 증가하는 비용은 계약자가 부담한다.
- 5) 계약자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 발주기관이 지적한 사항에 대해 재시공 또는 보완하지 않을 경우 발주기관은 다른 방법으로 제거 또는 보완할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 비용 등은 계약자가 부담한다.
- 6) 모든 전시 관련 자료(영상비디오, 필름, 사진, 데이터, 그림, 실물 등)의 확보(촬영, 구매, 임대, 지급 등) 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 과업수행자가 민형사상의 모든 책임을 져야한다.
- 7) 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라 과업수행자의 부담으로 제작·설치하여야 한다.
- 8) 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 시설물의 경우 종합적인 안전 대책을 포함하여 제시하여야 한다.
- 9) 전시(사인물) 및 체험시설에 적용된 모든 S/W는 수정 가능한 원본파일을 외장하드에 담아 완공 시 발주기관에 납품하여야 한다.

나. 분야별 세부사항

1) 사업대상지 분석 및 추진계획

- ① 사업대상지 분석과 주민설명회 등 지역사회 의견 수렴을 통하여 방문객 증대를 도모할 수 있는 최적화된 디자인(안)을 도출하여야 한다.
- ② 여타 야간경관조성사업과 차별화된 사업대상지만의 특성을 부각시키고, 방문객 증대를 통한 지역 상권 활성을 도모할 수 있도록 추진계획을 수립하여야 한다.

2) 동선계획 및 공간조성계획

- ① 방문객의 방문유형별 체류시간, 이동거리 등을 고려하여 동선계획(안)을 수립하여야 한다.

- ② 주변 환경과 어울리는 조형물을 배치하여 방문객의 관심을 유도할 수 있는 공간을 조성하여야 한다.

3) 시설계획

- ① 사업자는 기술적 참고자료를 충분히 수집·분석, 운영요원이 최소화될 수 있도록 제작·설치하되, 이에 대한 종합적·상시적·체계적 관리·운영 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 한다.
- ② 시설물(경관조명, 조형물 등)은 주간에도 주변 경관과 자연스럽게 어울리도록 설계·제작·설치하여야 하며, 방문객의 시각적 피로감과 주변 수목의 생육에 끼치는 영향을 최소화하는 조명환경을 연출하고, 빛 공해를 유발하지 않도록 제작·설치하여야 한다.
- ③ 설치된 시설물은 소음, 진동, 발열, 작동의 오류 및 관람객의 부상에 대비하여 제작단계에서 충분한 시운전 및 테스트를 거쳐야 한다.
- ④ 경관조명과 조형물의 배치와 디자인은 사업명과 어울리도록 연출하고 경관조명은 산책로를 따라 설치하되 지나치게 밝지 않도록 조도를 조정하여야 하며, 조형물의 경우 간접조명이나 LED 전구를 활용하여 야간에도 감상이 가능하도록 제작·설치하여야 한다.
- ⑤ 산책로의 특징을 시각적으로 극대화할 수 있도록 첨단 조명 연출방법을 적극 고려·활용하고, 이에 대한 연출 및 설치에 전문가의 자문을 구하고 발주처의 승인을 받아 시행하여야 한다.
- ⑥ 각 시설물은 충분한 견고성과 안전성을 갖추어 제작되어야 하며, 하자담보 책임기간 이후에도 보수 및 재설치가 가능하도록 대안을 제시하여야 한다.
- ⑦ 산책로 및 전망대 등에 설치되는 모든 사인물(안내판, 전시패널, 기타 관련 소품 등)은 안정적이고 무해하며 부식에 강한 재질 및 형태로 설계하고 야간에도 가독성을 확보할 수 있도록 제작·설치하여야 한다.
- ⑧ 안내판의 내용은 외국인 관람객의 관람편의를 위해 2개국어(한글, 영어필수) 이상으로 제작하여야 하고 안내판의 디자인은 발주기관과 협의 후 결정한다.
- ⑨ 모든 자료는 과업수행자가 그 해당 내용에 대해서 보증하여야 하며, 이미지 사용 및 내용 등이 기존의 지적 재산을 침해하지 않는 범위안에서 제작하여야 하고, 관련 증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 과업수행자가 민형사상의 모든 책임을 져야한다.

4) 모형전시물

- ① 모든 모형은 실물과 동일한 형상으로 정밀하고 내구성이 강한 소재를 사용하여 제작하여야 하며, 디지털기법 등을 활용하여 창의적으로 구상한다.
- ② 복제품의 경우 실물확인을 통한 실측 및 관련 전문가의 고증을 거쳐야 하며, 표현방법에 있어서도 발주기관의 협의를 얻어야 한다.
- ③ 모형제작을 위해 구체적 설계도면을 작성해야 한다.

5) 영상물

- ① 전시분위기 및 전시물의 이해를 돕고 관심을 집중할 수 있는 영상 시나리오를 계획하여 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.
- ② 전시영상물은 같은 공간에 설치, 운영되는 다른 콘텐츠와의 연계성, 통일성을 고려하여 전체적인 구성과 연출이 이루어질 수 있도록 연출한다.
- ③ 제작된 영상물은 최신 기기와 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 계획되어야 한다.
- ④ 영상물 설치는 영상물, 영상케이블, 전기설비, 거치대, 영상 세팅 등 일체를 포함한다.
- ⑤ 영상물은 가장 양질의 상태로 보여지고 음성신호가 명료하게 전송되도록 특성에 맞는 하드웨어(모니터, 스피커 등)를 선정한다.
- ⑥ 영상, 배경음악 및 음향효과를 위해 이미 개발되어 있는 저작물을 사용할 경우 과업수행자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보 증빙서류를 제출하여야 하며, 분쟁 발생시 과업수행자가 민형사상의 모든 책임을 져야한다.

6) 콘텐츠 개발 및 제작

- ① 앞산의 역사·문화·자연경관을 관람객에게 정확하고 흥미롭게 전달할 수 있도록 콘텐츠를 개발한다.
- ② 앞산의 역사와 관련된 사진 및 자료를 확보하여 스토리를 개발·구성한다. 이때, 모든 자료는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보 증빙서류를 제출하여야 하며, 분쟁 발생시 과업수행자가 민형사상의 모든 책임을 져야한다.

7) 운영 및 사후관리

- ① 시설물의 안정적 작동, 효율적인 유지보수, 관리·운영을 위한 매뉴얼을 세부적으로 작성하고, 유지 보수(교체·정비) 비용, 주기 등을 포함한 관리방안을 함께 제시하여야 한다.

- ② 시운전 또는 운영 단계에서 잦은 고장 및 수리(하자담보 책임기간 중 동일한 부속 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설물은 하자 또는 불량품 납품으로 보아 근본적인 해결 방안을 제시하고, 발주기관의 요구 시 부분 또는 전면 재설치하여야 한다.

다. 제안 유의사항

- 1) 제안에 반영되는 모든 재료는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수 재료를 선택해야 함
- 2) 디자인 및 재료는 무해하고 안정성이 검증된 재료를 선택해야 함
- 3) 제안자는 제출한 제안도서에 대해 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 경우에는 수정하여 작업을 진행해야하고, 추가비용은 별도로 반영하지 않아야 함
- 4) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재해야 함
- 5) 제안 내역 작성 시 인건비는 정부 노임 단가를, 자재 및 재료비(구체적인 규격, 단가, 수량등을 산출근거로 제시)는 조달청 발행 가격정보 최근호에 따르며, 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용하여 산출근거를 제시해야함
- 6) 시설물의 제작·설치 및 차후 부품교체, 하자보수, 철거 등 관리 유지의 용이를 고려하여 제안해야 함

라. 사업수행조건

- 1) 사업자는 업무를 총괄 관리할 수 있는 사업총괄 책임자를 선정하여 발주기관에 보고하여야 하고, 사업총괄책임자는 발주기관의 지시를 받아야 한다.
- 2) 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 변경 및 설계 수정·보완을 요구할 수 있으며, 이에 사업자는 계약금액 내에서 발주기관의 지시 및 요구에 따라 수정·보완을 이행하여야 한다
- 3) 사업자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.
- 4) 모든 전시물(모형, 영상, 패널 등)에 대하여 각각의 제작도면을 제출하여 승인을 받아야 하며, 발주기관의 승인을 받은 후 제작한다.

- 5) 설계도서 납품 시 설계내역은 기획재정부장관이 고시한 정부회계원가계산용역 기관에 사업자가 비용을 부담하여 원가계산을 의뢰하여야 한다.
- 6) 사업수행 중 발주기관이 제작도면 승인 이전에 전시물의 변경을 요청할 경우, 사업자는 계약금액 조정없이 이를 반영해야 한다.
- 7) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경·중지할 수 있다.
- 8) 사업자는 사업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하여야 하고, 법령 등에 의한 각종 인·허가 관련 업무를 성실히 수행하여야 하며, 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다. 또한 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않는다.
- 9) 발주기관은 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 자문을 받도록 사업자에게 요구할 수 있고, 사업자는 이에 대한 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다. 이때 발생한 모든 비용은 사업자가 부담한다.

Ⅲ 과업수행 지침

1. 일반사항

- 가. 발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 과업수행자에 대하여 계약관련 업무 내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 과업수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.
- 나. 발주기관은 품질 확보를 위해 과업수행자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 과업수행자는 발주기관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.
- 다. 발주기관은 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 전문가에게 자문을 받도록 과업수행자에게 요구할 수 있으며, 자문에 대한 소요 비용은 과업수행자가 지불하고, 자문에서 제시된 의견에 대해서는 발주기관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다.
- 라. 중간보고회, 최종보고회 등 과업수행에 들어가는 모든 보고서 자료 및 소요 비용은 과업수행자가 부담한다.
- 마. 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 변경 및 설계 수정·보완을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 계약금액 내에서 발주기관의 요구에 따라 수정·보완을 이행하여야 한다.
- 바. 과업수행자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 과업수행자는 책임을 져야 하며, 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 과업수행자 부담으로 시정·조치하여야 한다.
- 사. 과업수행자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.
- 아. 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하고, 법령 등에 의한 인·허가 업무를 성실히 수행하여야 하며, 관련 법령 등의 저촉 또는 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.
- 자. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경·중지할 수 있다.
- 차. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 참여하고 있는 실무기술자가 과업 수행에 불성실하거나 부적당하다고 발주기관이 인정하는 경우 과업수행자에게 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

카. 과업수행자는 보안 관계 법규에 의한 보안 관리에 최선을 다해야 하며, 과업수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

타. 착수 신고서 제출 : 과업수행자는 계약체결 후 7일 이내 제반서류 제출

- 1) 착수계
- 2) 과업수행계획서
- 3) 참여자 이력서 및 기술자격증 사본
- 4) 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본
- 5) 예정공정표
- 6) 보안서약서
- 7) 기타 발주기관이 요구하는 사항

2. 계약의 이행 및 해지

가. 과업수행자는 본 과업이행요청서, 관계법령 및 규정에 따라 성실히 과업을 수행하여야 한다.

나. 본 과업 수행 중 참여 전문인력 등의 변동사항이 있을 때에는 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다. 발주기관은 다음 각 호의 사유로 과업수행자가 과업수행을 계속하기 곤란하다고 판단될 때에는 계약을 해지할 수 있다. 이 경우, 계약해지로 인하여 손해가 발생하는 경우에는 과업수행자가 그 손해에 대한 배상을 하여야 한다.

- 1) 발주기관의 정당한 요구 및 지시에 불응하거나 이행하지 않을 때
- 2) 계약기간 내에 과업을 완료할 능력이 없거나 공정이 현저히 늦어질 때
- 3) 과업수행과정 중 불성실 또는 부주의로 인하여 중대한 과실이 발생 인정되거나 고의적인 불성실로 과업성과에 만족을 기대할 수 없는 경우
- 4) 과업의 전부 또는 일부를 부당하게 하도급하거나 중대한 계약조건을 위반한 때
- 5) 과업참여시 제출된 각종 증빙자료가 허위로 작성되었음이 인정되었을 경우
- 6) 본 과업이행요청서에 제시한 조건에 미달 또는 위배한 경우

3. 과업 및 설계내용 변경 조건

가. 본 용역수행중 의견이 상이할 때는 발주처의 해석에 따르며, 과업수행 결과 과업 물량의 증·감이 발생되었을 경우 예산범위 내에서 설계변경 할 수 있다.

나. 용역수행자는 과업의 수행 중 아래의 사유로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우에는 대구시와 협의하여 설계변경과 과업기간을 변경할 수 있다.

- 1) 천재지변으로 과업을 수행할 수 없을 경우
- 2) 과업수행기간 중 관련법령·규정 및 지침 등의 개정 및 상위계획 변경 등 여건변화로 인하여 과업의 면적, 범위 및 기간의 변경이 필요하다고 인정될 때
- 3) 대구시의 정책변화, 과업량의 증감 발생, 계획의 변경 등
- 4) 기타 우리시에서 인정하는 사항

다. 위항의 사유로 과업변경요인이 발생될 경우 또는 계약체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나, 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때에는 해당 금액을 조정하거나 준공 후라도 환수조치 할 수 있으며, 행정절차 이행요인이 발견될 시는 준공을 하더라도 대금지급을 일부 유보할 수 있다.

라. 본 과업의 수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우 계약만료 30일 전에 관계사유를 명시하여 연기원을 제출하여야 하며 그 사유가 타당하다고 인정될 때에는 계약기간을 조정할 수 있다.

4. 보안사항

가. 과업수행자는 과업참가자의 보안관리 이행각서를 제출하여야 하고, 본 과업을 수행함에 있어 취득한 제반사항에 대하여는 철저히 보안을 유지한다.

나. 과업이 완료된 후에도 이를 엄수해야 하며, 특히 과업내용이 외부로 유출되는 일이 없도록 하여야 한다.

다. 본 사업수행으로 수집한 각종 자료 등은 발주기관이 소유하며, 발주기관의 승인 없이 제3자에게 대여 또는 유포할 수 없다.

라. 과업수행 중에 발생하는 제3자의 작품표절 및 인용으로 인하여 발생하는 손해 및 민형사상의 분쟁 일체는 과업수행자가 책임진다. 단, 과업수행자가 위사항에 대하여 귀책사유가 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니한다.

5. 과업수행 결과에 대한 보완의무

가. 본 과업 수행으로 인하여 생산된 모든 성과품 일체에 대한 소유권은 발주기관에게 있으며, 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달하다고 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 과업수행자는 이를 성실히 보완하여야 한다.

나. 과업 수행 중 또는 수행 후 보완사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자에게 있다.

6. 성과품 제출 목록

가. 완료보고서(A4)	5부
나. 설계설명서(A4)	5부
다. 설계도면(A3)	5부
라. 산출내역서(원가계산서 포함)(A4)	5부
마. 시방서, 자재, 장비 사양서(A4)	각5부
바. 관리운영, 유지관리계획서(A4)	5부
사. 공정표(A4)	5부
아. 구조계산서(해당되는 경우 제출)	5부
자. 조감도(A1, 폼보드 부착)	2점
차. 성과품 CD(USB)	2점

7. 사업비의 정산

- 가. 사업종료 후(제출물의 제출 완료 이후) 정산을 원칙으로 하되, 기타사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거 정산할 수 있다.
- 나. 사업규모 및 내용이 부득이하게 감소하였을 때에는 계약금액에서 감소한 사업내용의 비용을 감액하여 정산 함
